




VHSA - 0033

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – MONTACARGAS NO ENCIENDE

|                                        |                                         |                             |                               |                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México              | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0033 | <b>N. Orden:</b> KAUF0011     | <b>Fecha:</b> 22 de octubre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Caterpillar | <b>Modelo:</b> DP70                     | <b>Serie:</b> AT20C70545    | <b>Capacidad:</b> 7 Toneladas | <b>Horometro:</b>                    |

1. SE DETECTA QUE NO CARGA EL ALTERNADOR

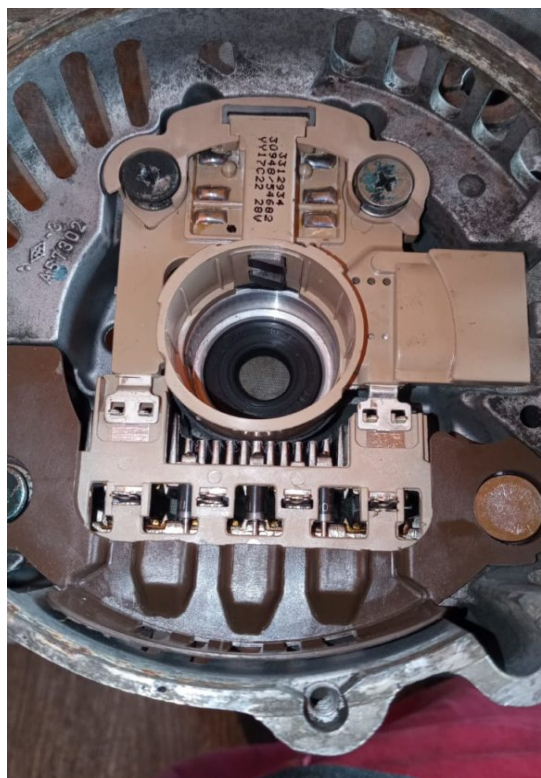

2. SE REEMPLAZA PORTA-CARBON Y PLACA PORTA DIODOS



3. QUEDA FUNCIONANDO EL ALTERNADOR





VHSA - 0033

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – MONTACARGAS NO ENCIENDE

|                                        |                                         |                             |                               |                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México              | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0033 | <b>N. Orden:</b> KAUF0011     | <b>Fecha:</b> 22 de octubre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Caterpillar | <b>Modelo:</b> DP70                     | <b>Serie:</b> AT20C70545    | <b>Capacidad:</b> 7 Toneladas | <b>Horometro:</b>                    |

### Materiales utilizados:

- 1 Pza. Porta carbon para alternador
- 1 Pza. Placa porta diodos para alternador

### Observaciones:

Queda funcionando correctamente el equipo  
Se recomienda cambio de alternador nuevo
